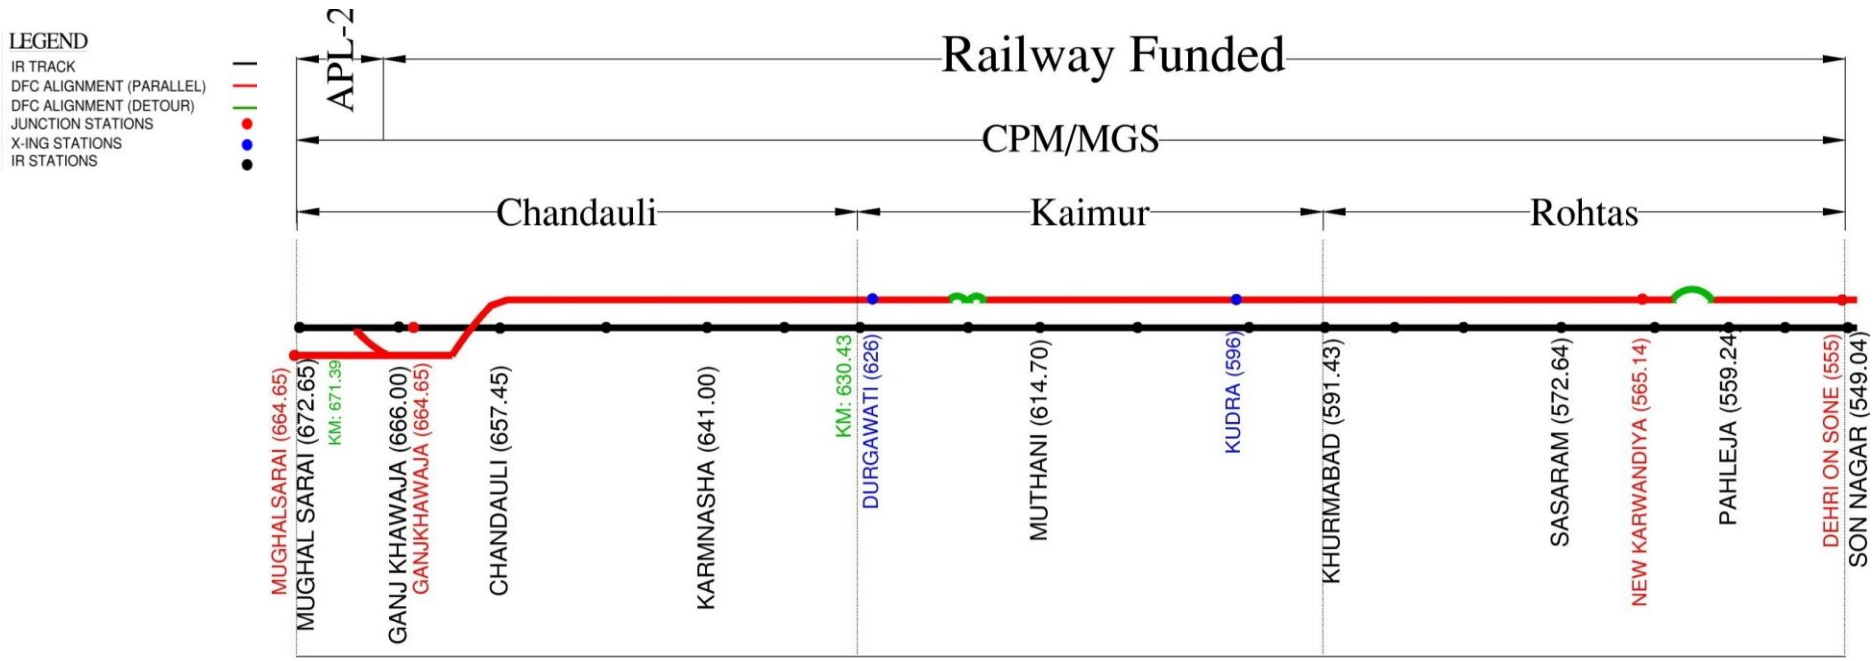

RAILWAY FUNDED (Land Acquisition Progress for the Month of December 2020)					
District		Chandauli	Kaimur	Rohtash	Aurangabad
Scope	(Kms)	25.53	50.37	40.07	9.2
	Area (Ha.)	59.78	113.87	122.85	36.85
20A (Ha.)		59.78	113.87	122.85	36.85
20E (Ha.)		59.78	113.87	122.85	36.85
20F (Ha.)		59.78	113.87	122.85	36.85
Award Declared (Crs.)		144.76	236.23	218.89	67.36
Disbursed (Crs.)		107.58	160.59	145.9	54.86
Land Taken over (Ha.)		59.78	113.87	122.85	36.85
