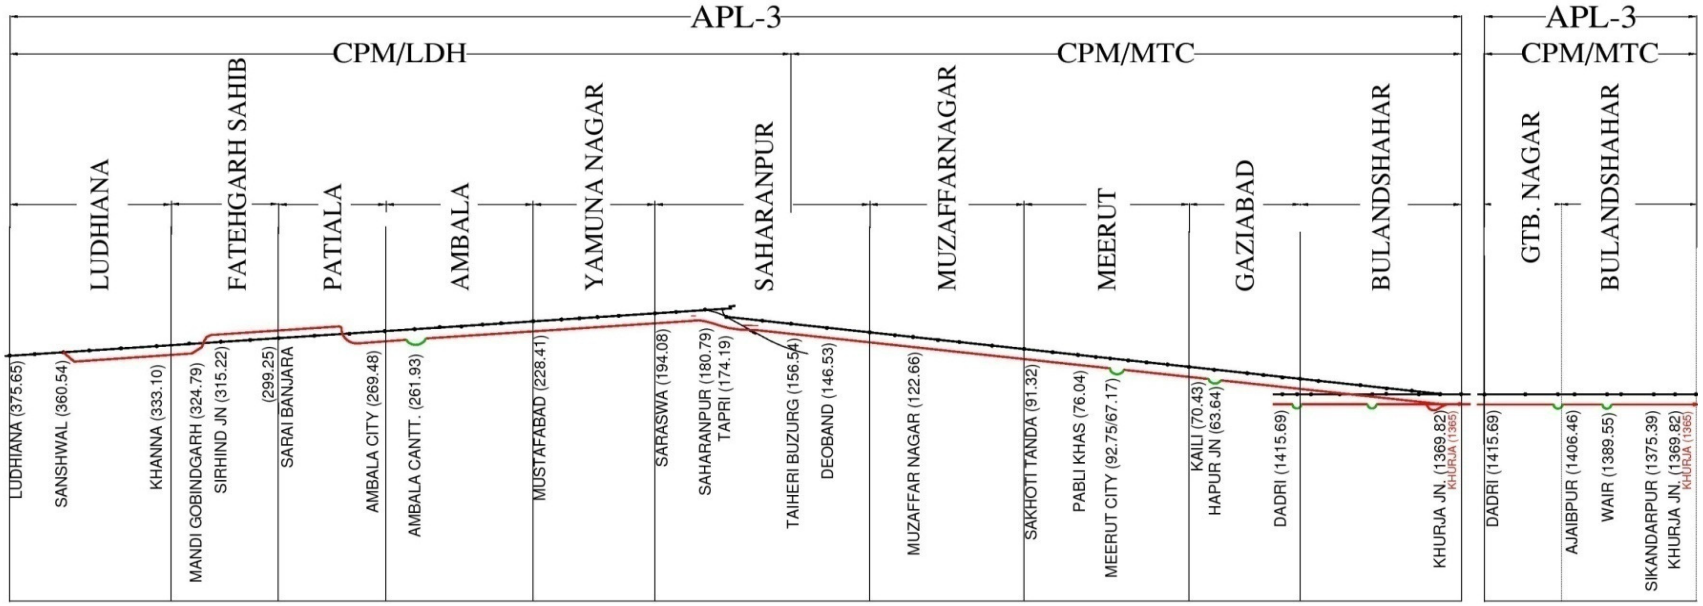

पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर - एपीएल-3 (भूमि अधिग्रहण प्रगति माह अप्रेल, 2014)

EDFC - APL-3 (Land Acquisition Progress for the Month of April 2014)

	(Kms)	33	27	27	43	29	65	44	59	24	53	17	26
	Area (Ha.)	69	103	79	65	13	87	21	82	57	59	51	80
20A (Ha.)		69	103	79	65	13	87	19	44	15	59	51	80
20E (Ha.)		69	103	79	65	13	87	19	44	15	54	51	70
20F (Ha.)		69	103	79	65	13	87	19	44	15	54	51	70
Award Declared (Crs.)		278	326	213	27	8	37	16	48	8	45	40	33
Disbursed (Crs.)		*254*	312	198	23	7	17	8	39	4	12	10	21
Land Taken over (Ha.)		63	99	74	56	11	39	10	35	8	14	13	46
Arbitration Cases No.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
